

报告编号	消检
总页数	19

安徽省建筑消防设施

检测报告

工程名称: 合肥市山口凌村民宿项目消防设施检测

工程地址: 合肥市肥东县长临河镇山口凌村

建设单位: 合肥东麓投资运营有限公司

安徽天意和消防技术有限公司

签发日期: 2025年4月15日



CS 扫描全能王

让办公更高效 扫描王APP

建筑消防设施检测报告

工程名称	合肥市山口凌村振兴民宿项目 消防设施检测	联系人	李经理	电话	0551-65887317
工程地址	合肥市肥东县长临河镇山口凌村	建筑高度	4.5m		
建设单位	合肥东麓投资运营有限公司	建筑层数	均为单层		
设计单位	/	建筑面积	4135 m²		
施工单位	合肥科建智安技术有限公司	建筑类别	民用建筑		
检测类别	委托检测	使用性质	餐饮、客房、商业		
序号	检测项目	检测范围			
1	火灾自动报警系统	外观检查、功能检查、联动功能测试			
2	消防给水及消火栓系统	外观检查、功能检查、联动功能测试			
3	应急照明与疏散指示标志	外观检查、功能检查、联动功能测试			
检测依据	《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）2018 版 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014） 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010） 《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004） 《建筑消防设施技术检验规程》DB34/137-1997				
检测器具	感烟感温探测器检验装置、消火栓系统试水装置、数字照度计、数字声级计、数字接地电阻测试仪、数字绝缘电阻表、红外测温仪、温湿度表、数字测距仪、钢卷尺、对讲机、秒表、风速仪、测力计等。				
检测日期	2025 年 4 月 11 日	天气：晴	湿度：50%	气温： 14-18℃	



建筑消防设施检测报告

1、火灾自动报警及消防联动控制系统

系统概况：本工程设有火灾自动报警系统，由 2 台相互独立的壁挂式报警主机组成，设置在书局和民宿客户中心的 2 台主机分别控制区域范围内共 57 只独立式感烟探测器，报警主机具有向指定用户手机发送远程报警信号的功能。

- (1) 系统形式：区域报警 ☒ 集中报警 ☐ 控制中心报警 ☐
- (2) 火灾报警控制器火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能符合 GB4717-93 标准要求 ☒
- (3) 火灾报警控制器的主备电源转换及状态显示符合要求 ☒
- (4) 火灾探测器、手动报警按钮功能检查符合要求 ☒
- (5) 火灾显示盘符合 GB17429-1998 标准第 3.2.1.2 条的要求 ☐
- (6) 消防联动控制设备功能符合 GB16806-1997 标准要求 ☒；
消防联动控制器与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时能在 100 秒内发出与火灾报警有区别的声、光故障信号 ☒
- (7) 可燃气体报警控制器（选项）可燃气体报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能符合 GB16808-1997 标准要求，主备电源转换及状态显示符合要求 ☐
- (8) 警铃（声、光报警装置）、消防广播工作正常 ☐，警铃（声报警装置）声压级高于背景噪声 20dB，符合要求 ☒
- (9) 感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器等设备安装符合 GB50166-2007 标准要求 ☒
- (10) 检查导线和电缆的绝缘电阻、系统接地电阻记录 ☒，数据符合要求 ☒，设备的保护接地符合要求 ☒，工作接地符合要求 ☒
- (11) 火灾报警联动系统在自动状态下，接收到火灾报警信号时，电梯迫降至首层，电梯反馈信号正常 ☐
- (12) 在消防控制中心，远程控制消防电梯，电梯迫降至首层，电梯反馈信号正常 ☐



建筑消防设施检测报告

2、室内消火栓系统

该民宿区域在建筑内设有室内消防轻便水龙(DN16)和消防卷盘系统。

1、水带、水枪齐全、完好,接口垫圈完整。水带、水枪、消防接口相互匹配、型号、规格统一。室内消防轻便水龙长度 20 米,水带口径 16 毫米;消防卷盘长度 30 米,水带口径 19 毫米;符合设计和“检测规程”要求。

2、最不利点室内消防卷盘出口动压 0.15MPa,充实水柱长度大于 10 米;符合设计和“检测规程”要求。

- (1) 系统形式: 临时高压系统 ☒ 常高压系统 ☐ 局部稳压装置 ☐
- (2) 消防水池和消防水箱符合要求 ☒
- (3) 稳压泵、增压泵及气压水罐进出口阀门常开,启动运行正常,启停泵压力值符合设计要求,压力表显示正常 ☒
- (4) 消防水泵进出水口阀门有明显的系统名称、编号标识,压力表、试水阀、防超压装置工作正常 ☒
- (5) 泵启、停及运行正常,信号反馈及显示正常 ☒
- (6) 水泵控制柜有明显的系统名称、编号标识,控制及显示功能正常,按钮启、停泵正常,主、备泵转换和主备电源切换功能正常 ☐
- (7) 室内消防卷盘箱及组件符合设计及标准要求 ☒
- (8) 室内消防水带及消防卷盘箱安装符合要求,阀门启闭灵活 ☒
- (9) 有利点和不利点栓口静水压力符合规范和设计要求,静水压力 $\leq 1.0\text{MPa}$ ☒
- (10) 启泵按钮外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具,手动复位功能正常,确认灯显示正常 ☐; 远程按钮启泵正常,栓口出水压力符合规范和设计要求,出水压力 $\leq 0.5\text{MPa}$ ☐
- (11) 水泵接合器有明显的标识、安装及性能符合要求 ☐
- (12) 室外消火栓阀门启闭灵活,有防冻措施,启泵按钮符合要求,地下式消火栓有明显标志,井内无积水。室外消火栓出水正常 ☐



建筑消防设施检测报告

3、应急照明及疏散指示标志系统

情况说明:

1、应急照明及疏散指示标志为非集中控制非集中电源型,其外观完整,无腐蚀和机械损伤,安装牢固。

2、应急照明及疏散指示标志具有短路保护和试验无锁按钮,有状态指示灯,交流电源供电切断时,应急照明及疏散指示标志能顺利转入应急工作状态,转换时间不大于5秒。

3、应急照明及疏散指示标志的应急工作时间,自动充电和过放电保护符合“检测规程”要求。应急照明及疏散指示标志的亮度符合“检测规程”要求。

4、疏散指示标志的安装位置、文字和尺寸“检测规程”要求。

(1) 安装牢固、无遮挡、状态指示灯正常 ☒

(2) 切断正常供电电源后,应急照明工作状态的持续时间为 30 分钟、地面中心照度为 3Lx; 疏散指示标志的照明工作状态的持续时间为 34 分钟、地面中心照度为 3Lx 符合要求 ☒

(3) 切断正常供电电源后,消防泵房、消防控制室、防排烟风机房等发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,应急照明工作的照度不低于正常照明时的照度 ☐

(4) 疏散指示标志的指示方向正确 ☒

(5) 疏散指示标志的安装位置、间距符合要求 ☒



检 测 结 论

本次消防检测范围为合肥市山口红村乡村民宿项目的消防系统，共计 4135 平方米；项目原设有 9 只消防轻便水龙，由独立式感烟探测器组成的火灾自动报警系统及应急照明及疏散指示标志系统，为提升预防和扑救初起火灾的能力，本次消防补缺灭隐工程增设了 6 立方米的消防水箱和增压泵组成的消防给水系统和 6 处消防软管卷盘以及 2 座微型消防站、57 只独立式感烟探测器、2 只手动报警器和声光报警器，并分别配备有 2 台具有远程报警功能的火灾自动报警主机；根据建设单位委托，本次消防检测所包含的消防设施系统为民宿项目范围内所有（包括原有及新增部分）的：火灾自动报警系统、消防给水及水灭火系统、应急照明及疏散指示标志系统，经检测，各消防系统均符合检测合格标准（具体检测情况参见本检测报告附页），检测结论如下：

- 1、火灾自动报警系统功能判定为合格；
- 2、本次改造部分消防给水及水灭火系统功能判定为合格；
- 3、应急照明及疏散指示标志功能判定为合格。

安徽天意和消防技术有限公司（盖章）

2025年4月15日

批准人：

张永

审核人：

中华人民共和国
一级注册消防工程师
韦升全
13523000023

主检测人：

中华人民共和国
一级注册消防工程师
孙圣君
13423000268



附表二

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾探测器	探测器的类别与使用场所是否符合设计要求	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		底座应安装牢固	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器的确认灯应向便于人员观察的主要入口方向	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器至墙壁、梁边水平距离不小于 0.5m	大于 0.5m ☒ 小于 0.5m ☐
		至空调送风口边的水平距离不小于 1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m	至空调送风口 大于 1.5m ☒ 小于 1.5m ☐ 至多孔送风口 大于 0.5m ☒ 小于 0.5m ☐
		探测器的保护面积应符合规范	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器安装的倾斜角应不大于 45 度	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		宽度小于 3m 的内走道宜居中布置, 感烟探测器的安装间距不应超过 15m, 感温探测器安装间距不应超过 10m	烟感: 小于 15m ☒ 大于 15m ☐ 温感: 小于 10m ☐ 大于 10m ☐
		探测器功能及确认灯显示	符合要求 ☒
	手动报警按钮	应安装牢固, 并不得倾斜	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		应安装在墙上距地(楼)面高度 1.3-1.5m	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮, 手动报警按钮的间距不大于 30m	一个 ☒ , 多于一个 ☐ , 缺少 ☐ 间距小于 30m ☒ , 大于 30m ☐
		触发、复位功能及确认灯显示	见功能检测记录表
	消防电话	消控室与“119”通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		消控室与设备间通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		对讲电话通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
	警报装置	安装牢固、无松动	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		报警声强测试	背景噪声声强 <u>53</u> dB 报警声强 <u>79</u> dB



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾报警控制器	配线应整齐, 避免交叉, 固定牢固	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		端子板的接线端子, 接线不应超过两根	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		电缆芯和导线, 应留有不小于 20cm 的余量	大于 20cm ☐ 小于 20cm ☐
		导线应绑扎成束	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		导线引入线穿线后, 在进线管处应封堵	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		控制器的正面操作距离不应小于 1.2m	大于 1.2m ☒ 小于 1.2m ☐
		壁挂控制器的底边距地(楼)面高度宜为 1.3 ~ 1.5m, 且便于操作;	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		落地控制器底宜高出地坪 0.1-0.2m	高出地面 _____ m
		主电源引入应直接与消防电源连接, 应有明显标志。严禁使用电源插头	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		专用接地时, 电阻值不应大于 4Ω	电阻值 _____ 3.7 _____ Ω
		共用接地时, 电阻值不应大于 1Ω	电阻值 _____ 0.87 _____ Ω
		控制器的保护接地	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		火灾报警自检功能	按自检功能键 正常 ☒ 不正常 ☐
		消音、复位功能	按消音键复位键 正常 ☒ 不正常 ☐
		故障报警功能	给控制器输入故障信号, 故障报警 正常 ☒ 不正常 ☐
		火灾优先功能	先给控制器输入故障信号, 再输入火警信号 正常 ☒ 不正常 ☐
		报警记忆功能	按记忆功能键 正常 ☒ 不正常 ☐
		二次报警功能	手动消除报警信号, 再输入火警信号系统再次启动 正
		主、备电源转换功能	正常 ☒ 不正常 ☐



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果		
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾显示盘	接收火警信号、发出声光报警、指示火灾部位	正常 ☐	不正常 ☐	
		自检、消音、复位功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		故障信号保持、消除,火警优先功能、二次报警功能	正常 ☐	不正常 ☐	
	联动控制器	消音、复位功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		故障报警功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		电源自动转换和备用电源的自动充电功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		火灾报警和受检设备动作的记忆功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		备用电源的欠压和过压报警功能	正常 ☐	不正常 ☐	
		检查控制器的保护接地情况	符合要求 ☐	不符合要求 ☐	
		手动插入操作优先功能	按有关操作功能键 正常 ☒ 不正常 ☐		
	电源	切断火灾发生区域的正常电源,接通消防电源	手动切断 正常 ☒ 自动切断 正常 ☒	不正常 ☐ 不正常 ☐	
		消防泵	启动试验(手动、自动启动)	手动启动 正常 ☒ 自动启动 正常 ☐	不正常 ☐ 不正常 ☐
	控制柜工作状态		正常 ☐	不正常 ☐	
	喷淋泵	启动试验(手动、自动启动)	手动启动 正常 ☐ 自动启动 正常 ☐	不正常 ☐ 不正常 ☐	
		控制柜工作状态	正常 ☒	不正常 ☐	
	气体灭火系统	手动控制系统的紧急启停	正常 ☐	不正常 ☐	
		在报警、喷射各阶段、发出声、光警报信号,并能手动切除声信号	正常 ☐	不正常 ☐	
		显示系统的手动、自动工作状态	正常 ☐	不正常 ☐	



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	泡沫干粉灭火系统	控制系统的启、停	正常□ 不正常□
		显示系统的状态	正常□ 不正常□
	电梯及消防电梯	控制迫降、反馈信号	迫降: 正常□ 不正常□ 反馈信号: 正常□ 不正常□
	防火卷帘	控制半降、全降, 反馈信号	正常□ 不正常□ 反馈信号: 正常□ 不正常□
	平开防火门	控制平开防火门, 反馈信号	正常□ 不正常□
	应急照明	设置部位, 控制投入方式	部位: 符合要求 ☒ 不符合要求 ☐ 方式: 手动 ☒ 联动 ☐
	疏散指示灯	控制投入方式	手动 ☒ 联动 ☐
	火灾应急广播	控制投入方式	手动 ☐ 联动 ☐
	火灾警报装置	控制投入方式	手动 ☐ 联动 ☒
	空调	停止空调通风、关闭防火阀、反馈信号	正常□ 不正常□



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
联动控制功能	防火分隔	停止有关部位风机, 关闭防火阀, 并接收其反馈信号	正常 ☐ 不正常 ☐
		防火分隔的防火卷帘下降到底	正常 ☐ 不正常 ☐
		设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置, 并应具有自动、手动和机械控制的功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		关闭有关部位的防火门、防火卷帘, 并接收其反馈信号	火警确认后 正常 ☐ 不正常 ☐
	火灾事故照明灯和疏散指示灯的安裝及接通情况	常、备电切换	正常 ☒ 不正常 ☐
		疏散照明的地面照度不低于 3lx	实测数据 <u>3</u> lx
		安装应牢固, 无遮挡, 状态指示正常	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		布局、设置位置是否符合标准	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
	火灾报警装置	某楼层发生火灾, 宜先接通着火层及相邻的上、下层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		首层着火、宜先接通本层、二层及地下各层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		地下层着火, 宜先接通地下各层及首层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	气体灭火系统	30s 延时	实测时间 <u> </u> 秒
		自动关闭防火门、窗, 停止通风、空调装置	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	其它系统	所有电梯迫降至首层, 并接收其反馈信号	火警确认后 正常 ☐ 不正常 ☐
		切断相关部位的非消防电源	火警确认后切断 正常 ☒ 不正常 ☐
接通火灾事故广播、音质		正常 ☐ 不正常 ☐	



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
消火栓系统	管网	安装质量应符合规范要求	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		排污设置及排污情况	有 ☐ 无 ☐ 畅通 ☐ 不畅通 ☐
	减压阀组	安装质量及设置情况	有 ☐ 无 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		减压是否与设计相符	相符 ☐ 不相符 ☐
	室内消火栓	室内消火栓箱及组件符合设计及标准情况	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		安装质量, 阀门启闭情况	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		出水口动压、静压测试	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		水带规格和水带绑扎	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		消防软管卷盘接口绑扎牢固	有 ☒ 无 ☐ 符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		消火栓按钮启动复位功能与信号传送情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	水泵接合器	设置及安装质量标识情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		单向阀的密封性测试情况	启泵加压观察, 密封性: 好 ☐ 不好 ☐
	室外消火栓	安装位置是否合理便于消防车停靠和操作	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		与水泵接合器的间距是否符合规范要求	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		地下式消火栓应有明显标志, 井内无积水	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		阀门应启、闭灵活	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		出水情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		启泵按钮启泵及确认灯显示	正常 ☐ 不正常 ☐



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
自动喷水灭火系统	消防水池	水位及消防用水不被他用的设施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		补水设施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		防冻措施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	消防水箱	水位及消防用水不被他用的设施	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		出水管止回阀关闭应严密	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		防冻措施	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
	报警阀	湿式报警阀组安装质量、系统名称和保护标志牌	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		报警阀联动泵情况, 进出水口压力表	联动泵正常 ☐ 不正常 ☐
		室内地面排水设施	有 ☐ 无 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		开启试水阀门, 压力开关动作情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		水泵启动情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		延时 90 秒内水力警铃动作情况	延时_____秒水力警铃动作
		关闭试水阀门, 水力警铃和压力开关情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	管网	安装情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		末端试水装置处排污设置和排污情况	有 ☐ 无 ☐ 排污: 通畅 ☐ 不通畅 ☐
	喷头	安装应符合设计要求	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		方向正确	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		型号选择和保护面积是否符合规范要求 (有无盲区)	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
自动喷水灭火系统	喷淋泵	外观、型号和安装质量	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		电控箱启、停泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		消防中心启、停泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		报警阀联动泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备泵切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备电源切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	稳压泵	外观、型号和安装质量	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		手动和自动启泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		稳压泵功能检测情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备泵自动切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	水流指示器	信号输出情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		信号阀启闭功能情况	有 ☐ 无 ☐ 正常 ☐ 不正常 ☐
	水泵结合器	安装质量及设置情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		单向阀密封性测试情况	启泵加压 未渗漏 ☐ 有渗漏 ☐
	系统联动试验	开启末端放水装置, 喷淋泵动作情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		水力警铃、压力开关、水流指示器等设备的	正常 ☐ 不正常 ☐
		消防控制器上的信号显示情况	正常 ☐ 不正常 ☐



附页

一、山口红民宿项目感烟探测器编码及地理位址一览表

序号	编码	地理位址	检测结果	备 注
1	1	大厅	合格	
2	2	大厅	合格	
3	3	大厅	合格	
4	4	大厅	合格	
5	5	大厅	合格	
6	6	大厅	合格	
7	7	阶梯教室	合格	
8	8	学校	合格	
9	9	学校	合格	
10	10	饭店	合格	
11	11	饭店	合格	
12	12	饭店	合格	
13	2-1	101	合格	
14	2-2	102	合格	
15	2-3	201	合格	
16	2-4	202	合格	
17	2-5	301	合格	
18	2-6	302	合格	
19	2-7	303	合格	
20	2-8	305	合格	
21	2-9	601	合格	
22	2-10	602	合格	
23	2-11	701	合格	
24	2-12	702	合格	
25	2-13	801	合格	
26	2-14	802	合格	
27	2-15	803	合格	
28	2-16	1001	合格	
29	2-17	1002	合格	
30	2-18	1003	合格	
31	2-19	1005	合格	
32	2-20	901	合格	
33	2-21	902	合格	
34	2-22	茶舍	合格	
35	3-1	501	合格	
36	3-2	502	合格	
37	3-3	503	合格	
38	3-4	505	合格	



39	3-5	506	合格	
40	3-6	507	合格	
41	3-7	501B	合格	
42	3-8	1101	合格	
43	3-9	1102	合格	
44	3-10	1103	合格	
45	3-11	1201	合格	
46	3-12	1202	合格	
47	3-13	1203	合格	
48	3-14	1205	合格	
49	3-15	1206	合格	
50	3-16	1207	合格	
51	3-17	1301	合格	
52	3-18	1302	合格	
53	3-19	白马	合格	
54	3-20	清如	合格	
55	3-21	大黄山	合格	
56	3-22	黄麓	合格	
57	3-23	钟磬	合格	


二、山口凌民宿项目消防卷盘（轻便沙龙）检测情况一览表

序号	位址	检测结果	情况说明	备 注
1	3 号院	合格		原有
2	5 号院	合格		原有
3	5 号院	合格		原有
4	6 号院	合格		原有
5	8 号院	合格		原有
6	8 号院	合格		原有
7	11 号院	合格		原有
8	12 号院	合格		原有
9	13 号院	合格		原有
10	溪畔草堂厨房	合格		本次改造
11	山口书局内	合格		本次改造
12	大教室	合格		本次改造
13	私塾	合格		本次改造
14	凌家客栈中	合格		本次改造
15	凌家客栈前	合格		本次改造





三、原有民宿区域消防设施图

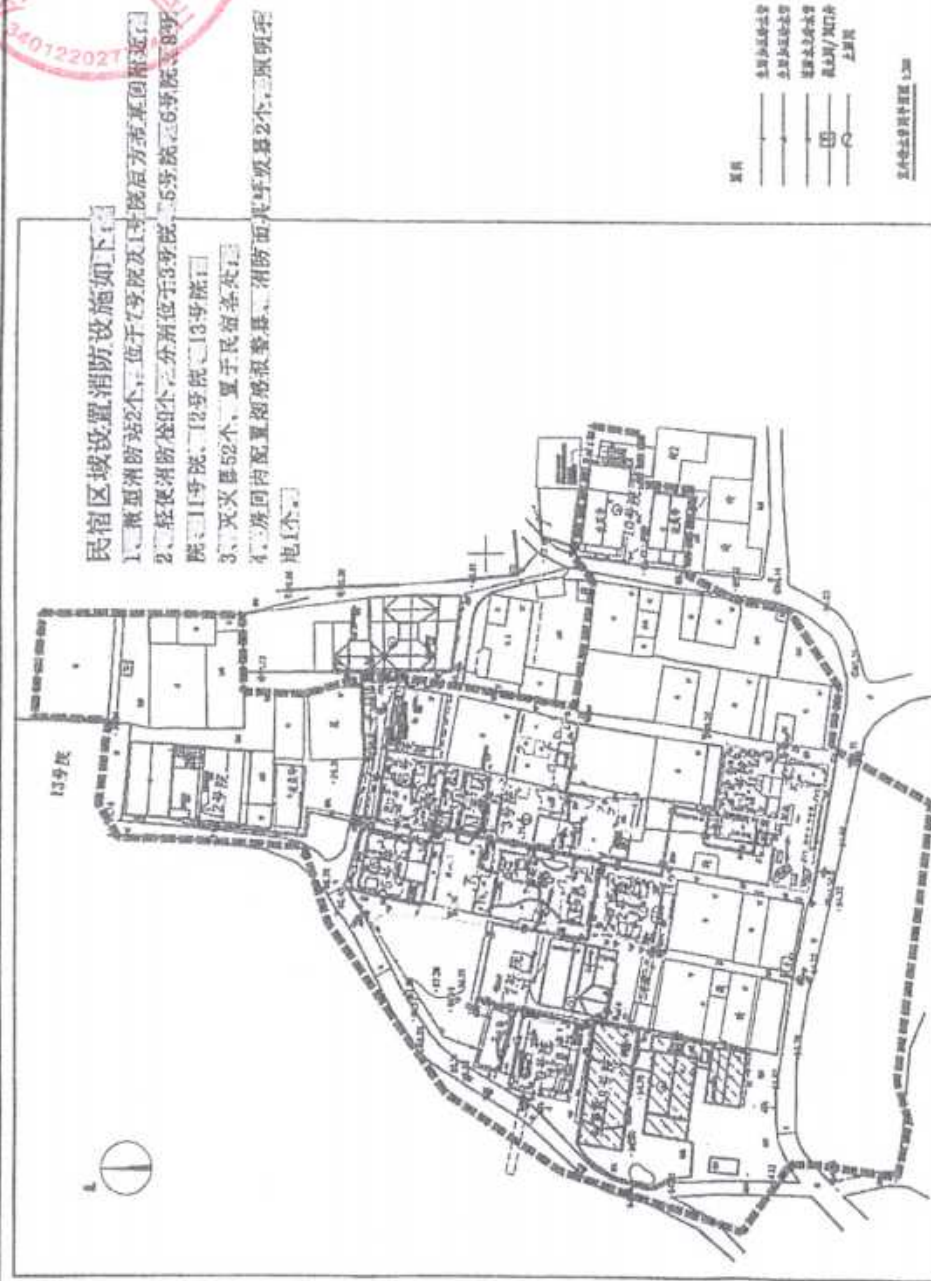

检测单位营业执照



營業執照 (副本)

统一社会信用代码
91340100395832556F(1-1)

[illegible]

注册资本	伍佰万圆整
成立日期	2014年09月03日
住所	安徽省合肥市高新区 产业园二期第15号

名称	类型	法定代表人	经营范围
安徽天德和医药有限公司	有限责任公司	王德成	药品、医疗器械、保健食品、化妆品等。



登记机关



2023

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过国家企业信用信息公示系统报送公示。

國家企業信用情報公司系統網址：
http://www.cchina.com.cn

國家市場監督管理總局



社会消防技术服务机构从业条件信息:

机构名称	安徽天意和消防技术有限公司	法定代表人	致燕
服务类型	消防设施维护保养检测/消防安全评估	统一社会信用代码	91340100395832556F
工商地址	合肥市高新区创新产业园二期F5栋1501室 9		

● 注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	孙圣君	一级	项目负责人	13423000268	2023年06月28日-2026年06月28日
2	韦升全	一级	技术负责人	13523000023	2024年05月27日-2027年05月27日

● 消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	创建日期
1	陈义立	四级/中级技能	233600300xxxxx1	消防设施操作员	2023-06-05
2	周树贵	四级/中级技能	153600300xxxxx0	消防设施操作员	2023-02-02
3	陆勤峰	四级/中级技能	233600300xxxxx1	消防设施操作员	2023-10-08
4	王长群	四级/中级技能	153600300xxxxx8	建筑物消防员	2020-07-27
5	曹承林	四级/中级技能	193600000xxxxx2	消防设施操作员	2022-03-21
6	韦彪	四级/中级技能	233600300xxxxx3	消防设施操作员	2023-05-23
7	陈夕罕	四级/中级技能	193600000xxxxx3	消防设施操作员	2021-11-23

● 自主录入

营业执照登记机关	合肥市工商行政管理局
录入日期	2020-07-27
执业范围	消防评估; 消防设施的检测、维护和保养; 消防工程设计及施工; 消防器材销售和安装; 消防知识和技能培训。



